No.		市町村・組合名	むつ市

様式１

汚水処理整備区域図　　アクションプラン

■目標年次	令和8年度

■手法毎の汚水処理整備区域

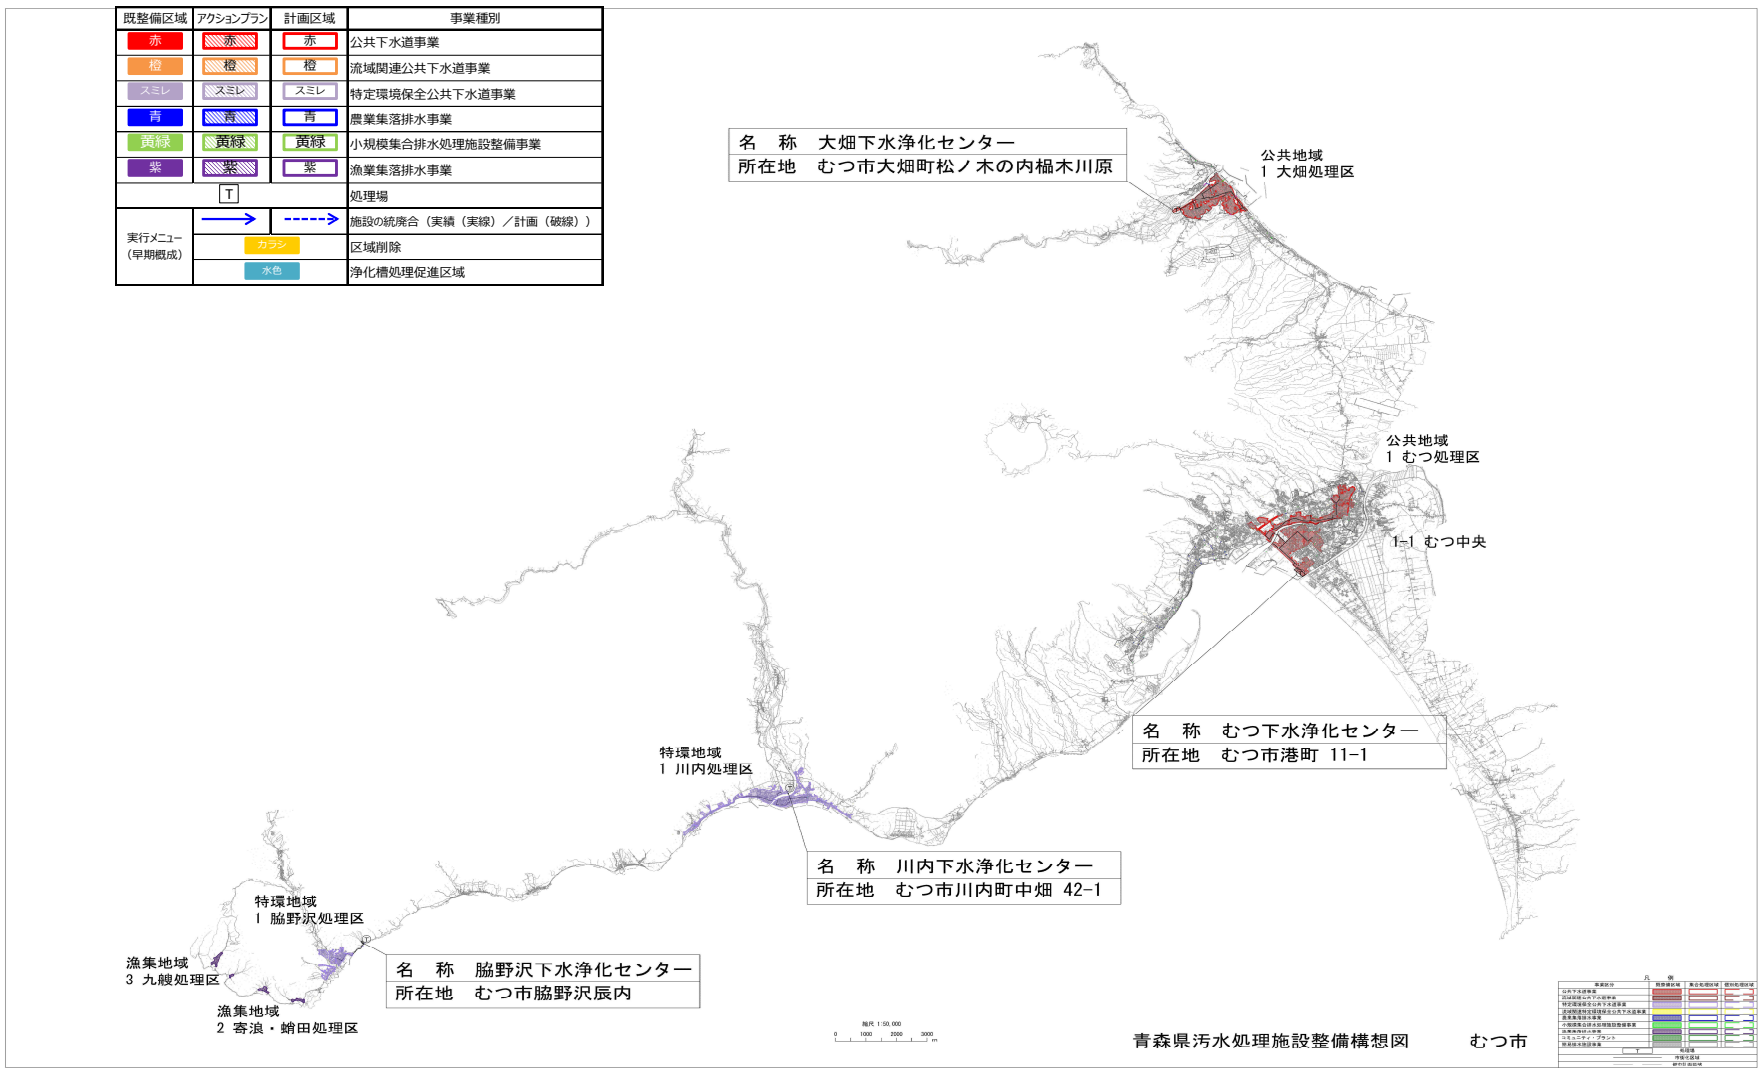

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1 平成27年	2 平成28年	3 平成29年	4 平成30年	5 令和元年	6 令和2年	7 令和3年	8 令和4年	9 令和5年	10 令和6年	11 令和7年	12 令和8年	備考
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
実行メニュー（早期概成）	共通	時間短縮手法による整備の実施													
	浄化槽	循環型社会形成推進交付金の活用 浄化槽処理促進区域の指定													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設・コミプラ	浄化槽		その他（未普及・汲み取り）	備考（早期概成手法の内容）
					個人設置型	市町村設置型		
現況値（R3年度末）	計画区域内人口（人） ①	54,364	35,625	157	18,582	0		
	整備人口（人） ②	27,833	11,709	157	15,967	0	26,531	
	整備面積（集合処理分）(ha) ③	555	544	11				
	汚水処理人口普及率(%) ④＝②÷①	51.2%	32.9%	100.0%	85.9%	0.0%	0.0%	
目標値（R8年度末）	計画区域内人口（人） ⑤	50,642	11,251	141	39,250	0		
	整備人口（人） ⑥	27,903	11,251	141	16,511	0	22,739	
	整備面積（集合処理分）(ha) ⑦	548	538	11				
	汚水処理人口普及率(%) ⑧＝⑥÷⑤	55.1%	100.0%	100.0%	42.1%	0.0%	0.0%	
日最大汚水量（m3/日）			4,025	118				
計画汚泥量（t-DS/日）		0.34	0.34	0.00				
概算事業費	管渠・ポンプ場（百万円）	20,753	20,274	479				
	処理場（百万円）	13,445	12,990	455		0		
	計（百万円）	34,198	33,264	934		0		
	年間維持管理費（百万円/年）	177	167	10		0		
整備人口１人当たりの建設費用（千円/人）		1,226	2,957	6,624	0	0	0	
実施メニュー	施設の統廃合	－						
	区域縮小	○	むつ処理区：1280ha→235ha 大畑処理区：295ha→138.6ha					
	浄化槽処理促進区域の指定	○			下水道処理区域外			
	その他（　　）	－						
